

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



*Puerto
Vallarta*

NUESTRO PUERTO
RENACE



INFORME TRIMESTRAL OCT-DIC 2024

CONTENIDO



OBRAS EN PROCESO OCT-DIC.



INVERSION POR FONDOS
Pavimentación



JEFATURA DE MANTENIMIENTO
Bacheo – Bocas de Tormenta



JEFATURA DE MAQUINARIA
Rehabilitación de calles



ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS






REPORTE DE OBRA. OCTUBRE

Número de Obra	Empresa	Descripción de Obra	Monto Contratado	Convenio Adicional	Monto total Obra final	Beneficiarios	Tipo de Recurso	% Avance Físico	Fecha de Inicio Programa de Obra	Fecha de Terminación Programa de Obra	Estatus
PV/DOP/LP/01/2024	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	\$ 15,445,073.87			8,862	ZOFEMAT	70%	15/03/2024	10/08/2024	Convenio en tiempo
PV/DOP/CSS/05/2024	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 6,002,417.31		\$ 4,604,402.51	3,728	FAISM	100%	13/05/2024	12/08/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/CSS/06/2024	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEP. HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE TE ATEMAJAC EN EL DISTRITO URBANO 4, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,271,264.54		\$ 3,214,704.40	4,770	FAISM	100%	13/05/2024	12/08/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/LP/08/2024	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 19,803,894.23			291 839	FONDOS MUNICIPALES	22%	24/04/2024	19/09/2024	PROCESO convenio en tiempo
PV/DOP/CSS/12/2024	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 6,293,256.26			897	FAISM	87%	13/06/2024	12/09/2024	PROCESO convenio de tiempo
PV/DOP/CSS/16/2024	ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A. DE C.V.	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 5,734,827.58	\$ 1,433,448.05	\$ 7,168,275.63	8862	FAISM	100%	12/06/2024	11/09/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/CSS/21/2024	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,918,771.33	\$ 1,685,572.27	\$ 8,604,343.59	4857	FAISM	100%	31/05/2024	30/08/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/CSS/28/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,962,117.64	SI		4,282	FAISM	87%	13/05/2024	12/08/2024	PROCESO Convenio de tiempo
PV/DOP/CSS/36/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 7,510,006.44	\$ 1,877,082.68	\$ 9,387,089.12	14,644	FAISM	100%	06/06/2024	06/09/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/CSS/37/2024	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 DE LA AV. FEDERACION ENTRE HERORES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 10,749,633.37	\$ 1,258,131.72	\$ 11,614,782.20	6,738	FAISM	100%	13/05/2024	12/08/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/AD/41/2024	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR, ENTRE CALLE BRASILIA Y AVENIDA MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 15,448,369.54	\$ 4,278,686.91	\$ 19,727,056.45	6,859	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	100%	15/07/2024	25/07/2024	EN CIERRE ADMVO.
PV/DOP/CSS/43/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,927,560.92	SI			FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	5%	09/09/2024	30/09/2024	PROCESO Convenio en tiempo
PV/DOP/AD/44/2024	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV. POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 988,142.02				FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	40%	13/09/2024	12/10/2024	PROCESO convenio de tiempo



REPORTE DE OBRA. NOVIEMBRE

Número de Obra	Empresa	Descripción de Obra	Monto Contratado	Beneficiarios	Tipo de Recurso	% Avance Físico	Fecha de Inicio Programa de Obra	Fecha de Término Programa de Obra	Estatus
PV/DOP/CSS/12/2024	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACIÓN Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.		897	FAISM	92%	13/06/2024	12/09/2024	PROCESO convenio en tiempo
PV/DOP/CSS/28/2024	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN PAOMI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,962,117.64	4,282	FAISM	92%	13/05/2024	12/08/2024	PROCESO convenio en tiempo
PV/DOP/CSS/43/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,927,560.92	7,719	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	25%	09/09/2024	30/09/2024	PROCESO convenio en tiempo
PV/DOP/AD/44/2024	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV. POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 988,142.02	56,800	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	80%	13/09/2024	12/10/2024	TERMINADA convenio en tiempo
DOP/CSS/01/2024	GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 12,136,982.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10.00%	02/12/2024	01/03/2025	Contratada en noviembre PROCESO
DOP/CSS/02/2024	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V.	INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,122,322.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10.00%	14/11/2024	12/02/2025	PROCESO
DOP/CSS/03/2024	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONS S.A DE C.V	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,425,098.90	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5.00%	25/11/2024	04/03/2025	EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
PV/DOP/CSS/04/2024	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 9,341,932.56	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5.00%	25/11/2024	24/03/2025	EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/CSS/05/2024	COMERCIALIZADORA PLECTO S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,876,365.56	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5.00%	25/11/2024	04/03/2025	EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/CSS/06/2024	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,692,845.37	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5.00%	25/11/2024	04/03/2025	EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/AD/07/2024	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,818,857.12	56,800	FONDOS MUNICIPALES	70.00%	08/11/2024	06/02/2025	PROCESO
DOP/AD/08/2024	C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,068,843.78	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5.00%	25/11/2024	22/02/2025	EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/AD/09/2024	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,466,307.74	56,800	FONDOS MUNICIPALES	80%	08/11/2024	17/01/2025	PROCESO



REPORTE DE OBRA. DICIEMBRE 1 de 2



Número de Obra	Empresa	Descripción de Obra	Monto Contratado	Beneficiarios	Tipo de Recurso	% Avance Físico	Fecha de Inicio Programa de Obra	Fecha de Terminación Programa de Obra	Estatus
PV/DOP/CSS/12/2024	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 6,293,256.26	897	FAISM	100%	13/06/2024	12/09/2024	TERMINADA convenio en tiempo
PV/DOP/CSS/28/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,962,117.64	4,282	FAISM	92%	13/05/2024	12/08/2024	PROCESO / CONVENIO ADICIONAL
PV/DOP/CSS/43/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,927,560.92	7,719	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	35%	09/09/2024	30/09/2024	PROCESO / CONVENIO ADICIONAL
PV/DOP/AD/44/2024	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV. POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL.	\$ 988,142.02		FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	100.00%	13/09/2024	12/10/2024	TERMINADA convenio en tiempo
DOP/CSS/01/2024	GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 12,136,982.72		FONDOS MUNICIPALES	60.00%	02/12/2024	01/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/02/2024	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V.	INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,122,322.72		FONDOS MUNICIPALES	60.00%	14/11/2024	12/02/2025	PROCESO
DOP/CSS/03/2024	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,425,098.90		FONDOS MUNICIPALES	30.00%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
PV/DOP/CSS/04/2024	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 9,341,932.56		FONDOS MUNICIPALES	23.00%	25/11/2024	24/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/05/2024	COMERCIALIZADORA PLECTO S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,876,365.56		FONDOS MUNICIPALES	28.00%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/06/2024	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,692,845.37		FONDOS MUNICIPALES	28.00%	25/11/2024	04/03/2025	EN PROCESO
DOP/AD/07/2024	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,818,857.12	56,800	FONDOS MUNICIPALES	95.00%	08/11/2024	06/02/2025	PROCESO
DOP/AD/08/2024	C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 1,068,843.78		FONDOS MUNICIPALES	25.00%	25/11/2024	22/02/2025	PROCESO
DOP/AD/09/2024	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,466,307.74		FONDOS MUNICIPALES	100.00%	08/11/2024	17/01/2025	PROCESO



REPORTE DE OBRA. DICIEMBRE 2-2

DOP/CSS/10/2024	CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 12,125,515.62	56,800	FONDOS MUNICIPALES	0%	06/01/2025	06/05/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/11/2024	CONSTRUCTORA INOPARK S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 10,661,329.17	2,500	FONDOS MUNICIPALES	0%	13/01/2025	20/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/CSS/12/2024	BRIORA TERRACERIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO.	\$ 3,415,722.55	4,500	FONDOS MUNICIPALES	0%	10/01/2025	20/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/CSS/13/2024	NIETO Riestra DESARROLLADORA, S. A. DEC. V	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCEANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,425,549.19	56,800	FONDOS MUNICIPALES	0%	10/01/2025	10/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/14/2024	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,840,786.07	4,000	FONDOS MUNICIPALES	0%	14/01/2025	14/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/15/2024	SERVICIOS CONSTRUBEROMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 3,043,965.04	568	FONDOS MUNICIPALES	0%	15/01/2025	15/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/16/2024	CONSTRUCTORA CAMALA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 2,736,294.43	568	FONDOS MUNICIPALES	0%	10/01/2025	0%	EN CONTRATACION
DOP/AD/17/2024	NIETO Riestra DESARROLLADORA, S. A. DEC. V	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 12,057,458.91	56,800	FONDOS MUNICIPALES	0%	09/01/2025	19/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/18/2024	ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,407,278.50	106,800	FONDOS MUNICIPALES	0%	09/01/2025	18/04/2025	CANCELADA
DOP/CSS/19/2024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,049,726.52	56,800	FONDOS MUNICIPALES	0%	08/01/2025	18/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/CSS/20/2024	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 12,205,992.68	224,00	FONDOS MUNICIPALES	0%	08/01/2025	08/05/2025	EN CONTRATACION
DOP/CSS/21/2024	NIETO Riestra DESARROLLADORA, S. A. DEC. V	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 11,634,489.33		FONDOS MUNICIPALES	0%	15/01/2025	15/05/2025	EN CONTRATACION
DOP/CSS/22/2024	ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIMEX, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 11,781,340.18		FONDOS MUNICIPALES	0%	08/01/2025	08/05/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/23/2024	CONSTRUCTORA SOLURG, S. de R. L. de C. V.	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,425,549.19		FONDOS MUNICIPALES	0%	10/01/2025	10/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/24/2024	OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KINDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA	\$ 2,451,251.36		FONDOS MUNICIPALES	0%	08/01/2025	07/04/2025	EN CONTRATACION
DOP/AD/25/2024	CONSTRUCTORA CAMALA, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 2,440,937.82		FONDOS MUNICIPALES	0%	08/01/2025	07/04/2025	EN CONTRATACION

INVERSIÓN POR FONDOS

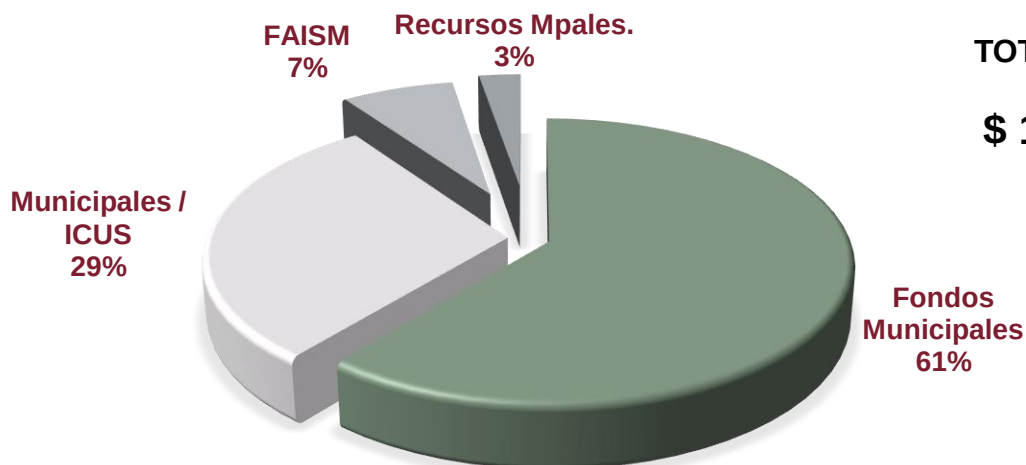

TOTAL DE INVERSIÓN

\$ 173,530,316.27



Pavimentación de calles

Mejoramiento urbano con obras de Pavimentación de calles.

6,432.79 M²



Empedrado Ecologico


22,085.62 M²



Concreto Hidraulico

TOTAL DE M2 DE PAVIMENTO CONTRATADOS

28,518.79 M²

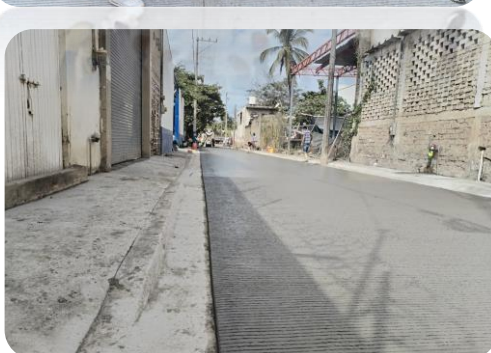

Relación de obras Pavimentación de calles

No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	SUPERFICIE DE LOSA CONTRATADA POR M2	SUPERFICIE DE EMPEDRADO CONTRATADO M2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA
PV/DOP/CSS/43/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO	628.67		7,719
DOP/CSS/01/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	3278.89		56,800
DOP/CSS/03/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO	1348.11		1,980
DOP/CSS/04/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO	726.08	1811.33	1,780
DOP/CSS/05/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,739.56		1,000
DOP/AD/07/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	608.68		56,800
DOP/CSS/10/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	4,533.16		56,800
DOP/AD/11/2024	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO" EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,492	3771.46	2,500
DOP/CSS/12/2024	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO	340.00	850.00	4,500
DOP/CSS/13/2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCEANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,190		56,800
DOP/AD/17/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	3,821.40		56,800
DOP/CSS/19/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,209.53		56,800
DOP/AD/23/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,169.54		1,900
		22,085.62	6,432.79	



JEFATURA DE MANTENIMIENTO

Bacheo en calles

Programa Permanente de Mantenimiento y rehabilitación de calles y principales avenidas en mas de 20 colonias atendidas con una o mas acciones.

715 M.²



Empedrado en
concreto

200 M.²



Asfalto

65 M.²



Empedrado
ecologico



JEFATURA DE MANTENIMIENTO

En cumplimiento a lo planteado en nuestros compromisos de mejorar la movilidad en el municipio en el trimestre oct-dic del año 2024, se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles a través del despliegue de cuadrillas de bacheo en las siguientes **colonias, calles y avenidas** del municipio:

Colonias atendidas

1.- 5 de diciembre
2.- Emiliano zapata
3.- el Pitillal
4.- Bobadilla
5.- canoas
6.- fovissste 100
7.- Ixtapa
8.- Guadalupe victoria
9.- las Arboledas
10.- el Coapinole
11.- Lázaro cárdenas
12.- Vallarta 500
13.- Vallarta 750

Calles y Avenidas

1.- Boulevard Luis Donaldo Colosio
2.- Av. Fco. Medina Asencio
3.- Exiquio Corona
4.- Libertad
5.- Av. los tules
6.- Avenida
7.- Libertad
8.- Ex Hacienda el Pitillal
9.- Av. México
10.- Parque Lineal

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES / BACHEO EN EL TRIMESTRE OCT-DIC 2024

Trabajos de mantenimiento	Oct	Nov	Dic	Total
	M2	M2	M2	M2
Bacheo en empedrado ahogado en concreto	165	330	220	715
Bacheo en empedrado ecológico	40	60	100	200
Bacheo en asfalto	35	30	0	65
Bacheo en adoquín	75	15	0	90
Totales	315	435	320	1070
		MONTO DE INVERSION:		\$ 1,009,504.20



JEFATURA DE MANTENIMIENTO

Rehabilitación de bocas de tormenta

Desazolve y reparación de bocas de tormenta en las principales calles y avenidas de la ciudad.

23 PZAS.



17 PZAS



3 PZAS.




Desazolve

Rehabilitación

Nuevas

Instalación de rejillas nuevas en bocas de tormenta de la Av. México.

Rejillas rehabilitadas en los puntos de Quimixto y Compostela, Nicaragua y Av. México, Fco. Medina Ascencio y Pablo Picasso, Manuel Lepe y de las Flores, Carretera a las palmas y Playa Costa Dorada, México y Portal Constitución, Av. México Y los Poetas, Fco Villa y González Gallo, Luis Donaldo y Colosio y Belice, Fco. Villa y Pavo Real, Av. México y Atemajac, Basilio Badillo e Insurgentes, Fco. Medina Ascencio frente a plaza Península, Los Tules frente a Plaza Caracol, Av México, Luis Donaldo Colosio frente a Semefo, calle Allende con calle Jamaica.

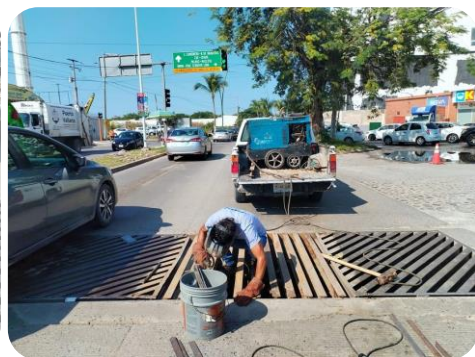

JEFATURA DE MAQUINARIA

Mantenimiento y rehabilitación de calles

Programa permanente de rehabilitación de calles de terracería, rellenos, nivelación. Compactación, cuneteo, retiro de material, con el propósito de mejorar el flujo vial y en general la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

124.36 km.



Nivelación y/o
raspado

25.40 km



Rellenos

25,92 km



Limpieza

Total de calles rehabilitadas con el uso de maquinaria: 175.68 km

Número de colonias beneficiadas: 85 colonias



ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS



Durante el trimestre octubre diciembre de 2024 se recibieron en la oficina de la Dirección de Infraestructura y Obra Publica un total de 52 peticiones ciudadanas destacando dentro de las principales necesidades:

1. Arreglo de calles
2. Limpieza de canales
3. Colocación de topes en calles
4. Limpieza de bocas de tormenta

90% de la solicitudes fueron atendidas

