

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



*Puerto
Vallarta*

NUESTRO PUERTO
RENACE



INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025

CONTENIDO



*JEFATURA DE CONSTRUCCION
OBRAS EN PROCESO ENERO-MARZO.*



*INVERSION POR FONDOS
II INFORME DE PAVIMENTACIÓN*



*JEFATURA DE MANTENIMIENTO
Bacheo – Bocas de Tormenta*



*JEFATURA DE MAQUINARIA
Rehabilitación de calles
Desazolve de Ríos arroyos y canales*



ATENCION A SOLICITUDES CIUDADANAS



GALERIA FOTOGRAFICA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Puerto
Vallarta

NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. ENERO 1-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
PV/DOP/CSS/28/2024	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,962,117.64	6,859	FAISM	94%	91.48%	13/05/2024	12/08/2024	PROCESO
PV/DOP/CSS/43/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,927,560.92	7,719	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	35%	17.82%	09/09/2024	30/09/2024	PROCESO
PV/DOP/AD/44/2024	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV. POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 988,142.02	56,800	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	100%	0%	13/09/2024	12/10/2024	PROCESO
DOP/CSS/01/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,136,982.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	92%	92.73%	02/12/2024	01/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/02/2024	INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 6,122,322.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	70%	39.15%	14/11/2024	12/02/2025	PROCESO
DOP/CSS/03/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 6,425,098.90	1,980	FONDOS MUNICIPALES	60%	16%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/04/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 9,341,932.56	1,780	FONDOS MUNICIPALES	50%	48%	25/11/2024	24/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/05/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,876,365.56	1,000	FONDOS MUNICIPALES	34%	11.42%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/06/2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.- ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,692,845.37	56,800	FONDOS MUNICIPALES	20%	0%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/AD/07/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 1,818,857.12	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	98.48%	08/11/2024	06/02/2025	TERMINADA
DOP/AD/08/2024	REHABILITACION DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 1,068,843.78	56,800	FONDOS MUNICIPALES	75%	69.70%	25/11/2024	22/02/2025	PROCESO
DOP/AD/09/2024	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UNA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,466,307.74	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	93%	08/11/2024	17/01/2025	PROCESO
DOP/CSS/10/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,125,515.62	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	06/01/2025	06/05/2025	PROCESO
DOP/AD/11/2024	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 10,661,329.17	2,500	FONDOS MUNICIPALES	15%	0%	13/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/12/2024	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO	\$ 3,415,722.55	4,500	FONDOS MUNICIPALES	25%	0%	10/01/2025	20/04/2025	PROCESO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. ENERO 2-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DOP/CSS/13/2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCEANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,425,549.19	56,800	FONDOS MUNICIPALES	45%	42.69%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/14/2024	CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,840,786.07	4,000	FONDOS MUNICIPALES	20%	0%	14/01/2025	14/04/2025	PROCESO
DOP/AD/15/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,043,965.04	568	FONDOS MUNICIPALES	35%	0%	15/01/2025	15/04/2025	PROCESO
DOP/AD/16/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 2,736,294.43	568	FONDOS MUNICIPALES	20%	0%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/17/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,057,458.91	56,800	FONDOS MUNICIPALES	20%	0%	09/01/2025	19/04/2025	PROCESO
DOP/AD/18/2024	INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,407,278.50	106,800	FONDOS MUNICIPALES			09/01/2025	18/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/19/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.- DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 6,049,726.52	56,800	FONDOS MUNICIPALES	40%	0%	08/01/2025	18/04/2025	TERMINACION ANTICIPADA
DOP/CSS/20/2024	REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,205,992.68	224,00	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/21/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 11,634,489.33	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	15/01/2025	15/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/22/2024	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 11,781,340.18	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/AD/23/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRISTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,425,549.19	1,900	FONDOS MUNICIPALES	33%	0%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/24/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA	\$2,451,251.36	390	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO
DOP/AD/25/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 2,440,937.82	568	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. ENERO 3-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,913,479.74	2,080	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	10/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 8,613,690.43	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/03/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 4,436,442.27	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	29/04/2025	PROCESO
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 7,133,606.98	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 4,757,022.37	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	28/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/06/2025	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 6,720,617.34	500	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	30/05/2025	PROCESO
DIOP/AD/08/2025	MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 2,409,759.83	540	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	21/01/2025	20/04/2025	PROCESO



REPORTE DE OBRA. FEBRERO 1-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
PV/DOP/CSS/28/2024	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$5,962,117.64	6,859	FAMIS	100%	91.48%	13/05/2024	12/08/2024	PROCESO
PV/DOP/CSS/43/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,927,560.92	7,719	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	75%	17.82%	09/09/2024	30/09/2024	PROCESO
PV/DOP/AD/44/2024	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV.POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL	\$988,142.02	56,800	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	100%	100%	13/09/2024	12/10/2024	PROCESO
DOP/CSS/01/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,136,982.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	92%	92%	02/12/2024	01/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/02/2024	INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUIA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$6,122,322.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	70%	39.15%	14/11/2024	12/02/2025	PROCESO
DOP/CSS/03/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$6,425,098.90	1,980	FONDOS MUNICIPALES	95%	16%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/04/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPIO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,341,932.56	1,780	FONDOS MUNICIPALES	80%	79%	25/11/2024	24/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/05/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$5,876,365.56	1,000	FONDOS MUNICIPALES	40%	11.42%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/06/2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$5,692,845.37	56,800	FONDOS MUNICIPALES	30%	0%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/AD/07/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$1,818,857.12	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	98.48%	08/11/2024	06/02/2025	TERMINADA
DOP/AD/08/2024	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$1,068,843.78	56,800	FONDOS MUNICIPALES	80%	69.67%	25/11/2024	22/02/2025	PROCESO
DOP/AD/09/2024	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	\$2,466,307.74	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	93.22%	08/11/2024	17/01/2025	PROCESO
DOP/CSS/10/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,125,515.62	56,800	FONDOS MUNICIPALES	30%	23%	06/01/2025	06/05/2025	PROCESO
DOP/AD/11/2024	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO" EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$10,661,329.17	2,500	FONDOS MUNICIPALES	25%	0%	13/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/12/2024	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO	\$3,415,722.55	4,500	FONDOS MUNICIPALES	37%	34%	10/01/2025	20/04/2025	PROCESO


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE


REPORTE DE OBRA. FEBRERO 2-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DOP/CSS/13/2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCEANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,425,549.19	56,800	FONDOS MUNICIPALES	92%	90%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/14/2024	CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,840,786.07	4,000	FONDOS MUNICIPALES	20%	0%	14/01/2025	14/04/2025	PROCESO
DOP/AD/15/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABAZOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,043,965.04	568	FONDOS MUNICIPALES	35%	0%	15/01/2025	15/04/2025	PROCESO
DOP/AD/16/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,736,294.43	568	FONDOS MUNICIPALES	50%	0%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/17/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,057,458.91	56,800	FONDOS MUNICIPALES	40%	33%	09/01/2025	19/04/2025	PROCESO
DOP/AD/18/2024	INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPEC, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$5,407,278.50	106,800	FONDOS MUNICIPALES			09/01/2025	18/04/2025	TERMINACION POR MUTUO
DOP/CSS/19/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.- DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$6,049,726.52	56,800	FONDOS MUNICIPALES	45%	0%	08/01/2025	18/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/20/2024	REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,205,992.68	224,00	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/21/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$11,634,489.33	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	15/01/2025	15/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/22/2024	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$11,781,340.18	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/AD/23/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,425,549.19	1,900	FONDOS MUNICIPALES	37%	0%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/24/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA	\$2,451,251.36	390	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO
DOP/AD/25/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,440,937.82	568	FONDOS MUNICIPALES	12%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO



REPORTE DE OBRA. FEBRERO 3-3

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,913,479.74	2,080	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	30/01/2025	10/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,613,690.43	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/03/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,436,442.27	1,200	FONDOS MUNICIPALES	32%	70%	30/01/2025	29/04/2025	PROCESO
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,133,606.98	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,757,022.37	1,200	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	28/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/06/2025	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,720,617.34	500	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	30/01/2025	30/05/2025	PROCESO
DIOP/AD/08/2025	MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,409,759.83	540	FONDOS MUNICIPALES	15%	0%	21/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DIOP/AD/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,795,353.53	291,839	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	11/02/2025	11/05/2025	PROCESO
DIOP/AD/10/2025	COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIA DE MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$1,621,194.95	56,800	FONDOS MUNICIPALES	95%	93.99%	11/02/2025	11/04/2025	PROCESO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. MARZO 1-3

DESCRIPCIÓN DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	BENEFICIARIOS	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
PV/DOP/CSS/28/2024	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,962,117.64	6,859	FAMIS	100%	100.00%	13/05/2024	12/08/2024	TERMINADA
PV/DOP/CSS/43/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,927,560.92	7,719	FONDOS MUNICIPALES (ICUS)	95%	78%	09/09/2024	30/09/2024	TERMINADA
DOP/CSS/01/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,136,982.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	99%	99%	02/12/2024	01/03/2025	TERMINADA
DOP/CSS/02/2024	INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 6,122,322.72	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	72.07%	14/11/2024	12/02/2025	TERMINADA
DOP/CSS/03/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 6,425,098.90	1,980	FONDOS MUNICIPALES	100%	62%	25/11/2024	04/03/2025	TERMINADA
DOP/CSS/04/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL. LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 9,341,932.56	1,780	FONDOS MUNICIPALES	95%	95%	25/11/2024	24/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/05/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 5,876,365.56	1,000	FONDOS MUNICIPALES	80%	67%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/CSS/06/2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACÍFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$ 5,692,845.37	56,800	FONDOS MUNICIPALES	60%	47%	25/11/2024	04/03/2025	PROCESO
DOP/AD/08/2024	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 1,068,843.78	56,800	FONDOS MUNICIPALES	75%	69.70%	25/11/2024	22/02/2025	PROCESO
DOP/AD/09/2024	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	\$ 2,466,307.74	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	98%	08/11/2024	17/01/2025	TERMINADA
DOP/CSS/10/2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FEDERACIÓN ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 12,125,515.62	56,800	FONDOS MUNICIPALES	27%	23%	06/01/2025	06/05/2025	PROCESO
DOP/AD/11/2024	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO" EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 10,661,329.17	2,500	FONDOS MUNICIPALES	80%	48%	13/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/12/2024	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO	\$ 3,415,722.55	4,500	FONDOS MUNICIPALES	70%	64%	10/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/13/2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCEANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$ 3,425,549.19	56,800	FONDOS MUNICIPALES	90%	90%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. MARZO 2-3

DESCRIPCIÓN DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DOP/AD/14/2024	CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,840,786.07	4,000	FONDOS MUNICIPALES	40%	29%	14/01/2025	14/04/2025	PROCESO
DOP/AD/15/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,043,965.04	568	FONDOS MUNICIPALES	90%	32%	15/01/2025	15/04/2025	PROCESO
DOP/AD/16/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,736,294.43	568	FONDOS MUNICIPALES	95%	0%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/17/2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,057,458.91	56,800	FONDOS MUNICIPALES	60%	34%	09/01/2025	19/04/2025	PROCESO
DOP/AD/18/2024	INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$5,407,278.50	106,800	FONDOS MUNICIPALES			09/01/2025	18/04/2025	TERMINACION ANTICIPADA
DOP/CSS/19/2024	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$6,049,726.52	56,800	FONDOS MUNICIPALES	100%	98%	08/01/2025	18/04/2025	PROCESO
DOP/CSS/20/2024	REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$12,205,992.68	224,00	FONDOS MUNICIPALES	55%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/21/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$11,634,489.33	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	15/01/2025	15/05/2025	PROCESO
DOP/CSS/22/2024	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$11,781,340.18	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	08/01/2025	08/05/2025	PROCESO
DOP/AD/23/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,425,549.19	1,900	FONDOS MUNICIPALES	56%	35%	10/01/2025	10/04/2025	PROCESO
DOP/AD/24/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA	\$2,451,251.36	390	FONDOS MUNICIPALES	50%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO
DOP/AD/25/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,440,937.82	568	FONDOS MUNICIPALES	90%	0%	08/01/2025	07/04/2025	PROCESO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



NUESTRO PUERTO
RENACE

REPORTE DE OBRA. MARZO 3-3

DESCRIPCIÓN DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA	TIPO DE RECURSOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,913,479.74	2,080	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	30/01/2025	10/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,613,690.43	1,200	FONDOS MUNICIPALES	15%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/03/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,436,442.27	1,200	FONDOS MUNICIPALES	98%	97%	30/01/2025	29/04/2025	PROCESO
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,133,606.98	1,200	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,757,022.37	1,200	FONDOS MUNICIPALES	15%	0%	30/01/2025	28/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/06/2025	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,720,617.34	500	FONDOS MUNICIPALES	30%	30%	30/01/2025	30/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/07/2025	REHABILITACIÓN ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO	\$12,981,465.04	56800	FONDOS MUNICIPALES	11%	0%	17/02/2025	17/06/2025	PROCESO
DIOP/AD/08/2025	MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,409,759.83	540	FONDOS MUNICIPALES	99%	100%	21/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DIOP/AD/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,795,353.53	291,839	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	11/02/2025	11/05/2025	PROCESO
DIOP/AD/10/2025	COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIA DE MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$1,621,194.95	56,800	FONDOS MUNICIPALES	94%	95%	11/02/2025	11/04/2025	TERMINADA
DIOP/CSS/11/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE LAS CALLES MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, ARROYO EL CONTENTILLO Y ARROYO PUNTA NEGRA, (DESDE CAUDILLO DEL SUR A ARROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$8,158,729.94	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/CSS/12/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,359,159.61	56,800	FONDOS MUNICIPALES	10%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/CSS/13/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARIA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCEANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,596,291.08	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	05/03/2025	13/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/14/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$7,012,650.44	56,800	FONDOS MUNICIPALES	15%	0%	05/03/2025	13/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/15/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$4,627,244.42	56,800	FONDOS MUNICIPALES	30%	0%	05/03/2025	03/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/16/2025	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$7,892,892.47	56,800	FONDOS MUNICIPALES	30%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/AD/17/2025	REHABILITACION DE CENEFAS, SELLO, LAVADO E INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS DE GRAPA EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,084,977.09	56,800	FONDOS MUNICIPALES	60%	0%	06/03/2025	14/04/2025	PROCESO
DIOP/AD/18/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SOLER ENTRE CALLE MARIO MORENO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA LA MODERNA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,516,764.41	56,800	FONDOS MUNICIPALES	11%	0%	06/03/2025	03/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/19/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO PITILLAL, DE CADENAMIENTO 0+000 (PUENTE BLV. FCO. MEDINA ASCENCIO) A CAD. 3+966.64 (PUENTE AV. FEDERACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$12,389,526.57	56,800	FONDOS MUNICIPALES	30%	30%	19/03/2025	17/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/20/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,526,353.49	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	19/03/2025	27/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/21/2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL, TRAMO 1(4+680 A 5+080) TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+420, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,013,393.15	56,800	FONDOS MUNICIPALES	5%	0%	19/03/2025	17/06/2025	PROCESO




DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



OBRA CONTRATADA EN EL TRIMESTRE ENERO- MARZO

DESCRIPCIÓN DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO INICIAL	BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA	FECHA DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA	ESTATUS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,913,479.74	2,080	21 DE ENERO 2025	10%	0%	30/01/2025	10/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,613,690.43	1,200	21 DE ENERO 2025	15%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/03/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,436,442.27	1,200	21 DE ENERO 2025	98%	97%	30/01/2025	29/04/2025	PROCESO
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,133,606.98	1,200	21 DE ENERO 2025	10%	0%	30/01/2025	29/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,757,022.37	1,200	21 DE ENERO 2025	15%	0%	30/01/2025	28/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/06/2025	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,720,617.34	500	21 DE ENERO 2025	30%	30%	30/01/2025	30/05/2025	PROCESO
DIOP/CSS/07/2025	REHABILITACIÓN ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO	\$12,981,465.04	56800	17 DE ENERO 2025	11%	0%	17/02/2025	17/06/2025	PROCESO
DIOP/AD/08/2025	MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,409,759.83	540	11 DE FEBRERO 2025	99%	100%	21/01/2025	20/04/2025	PROCESO
DIOP/AD/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,795,353.53	291,839	06 DE FEBRERO 2025	5%	0%	11/02/2025	11/05/2025	PROCESO
DIOP/AD/10/2025	COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIA DE MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,621,194.95	56,800	06 DE FEBRERO DE 2025	94%	95%	11/02/2025	11/04/2025	TERMINADA
DIOP/CSS/11/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE LAS CALLES MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, ARROYO EL CONTENTILLO Y ARROYO PUNTA NEGRA, (DESDE CAUDILLO DEL SUR A ARROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$8,158,729.94	56,800	25 DE FEBRERO 2025	5%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/CSS/12/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,359,159.61	56,800	25 DE FEBRERO 2025	10%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/CSS/13/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARÍA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCEANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,596,291.08	56,800	25 DE FEBRERO 2025	5%	0%	05/03/2025	13/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/14/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$7,012,650.44	56,800	25 DE FEBRERO 2025	15%	0%	05/03/2025	13/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/15/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$4,627,244.42	56,800	25 DE FEBRERO 2025	30%	0%	05/03/2025	03/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/16/2025	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$7,892,892.47	56,800		30%	0%	05/03/2025	03/07/2025	PROCESO
DIOP/AD/17/2025	REHABILITACION DE CENEFAS, SELLO, LAVADO E INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS DE GRAPA EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,084,977.09	56,800	21 DE FEBRERO	60%	0%	06/03/2025	14/04/2025	PROCESO
DIOP/AD/18/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SOLER ENTRE CALLE MARIO MORENO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA LA MODERNA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,516,764.41	56,800	21 DE FEBRERO	11%	0%	06/03/2025	03/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/19/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO PITILLAL, DE CADENAMIENTO 0+000 (PUENTE BLV. FCO. MEDINA ASCENCIO) A CAD. 3+966.64 (PUENTE AV. FEDERACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$12,389,526.57	56,800	10 DE MARZO	30%	30%	19/03/2025	17/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/20/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$9,526,353.49	56,800	10-MAR-25	5%	0%	19/03/2025	27/06/2025	PROCESO
DIOP/CSS/21/2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL, TRAMO 1(4+680 A 5+080) TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+420, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,013,393.15	56,800	10 DE MARZO	5%	0%	19/03/2025	17/06/2025	PROCESO
DIO/AD/27/2025	REHABILITACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA, COL LAS JUNTAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO.	\$2,091,416.18	56,800	31 DE MARZO	0%	0%	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	PROCESO
DIOP/AD/28/2025	REHABILITACION CDC IXTAPA CALLE MANCO COLONIA 24 DE FEBRERO EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,524,828.82	56,800	31 DE MARZO	0%	0%	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	PROCESO
DIOP/AD/29/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y BANQUETA EN RIBERA DEL RIO CUALE (DE CALLE MANANTIAL A PUENTE PEATONAL) EN COL. BUENOS AIRES, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,206,227.99	56,800	31 DE MARZO	0%	0%	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	PROCESO
	TOTAL DE OBRA CONTRATADA	143,424,089.43							

RESUMEN DE INVERSIÓN DE LOS PRINCIPALES FONDOS

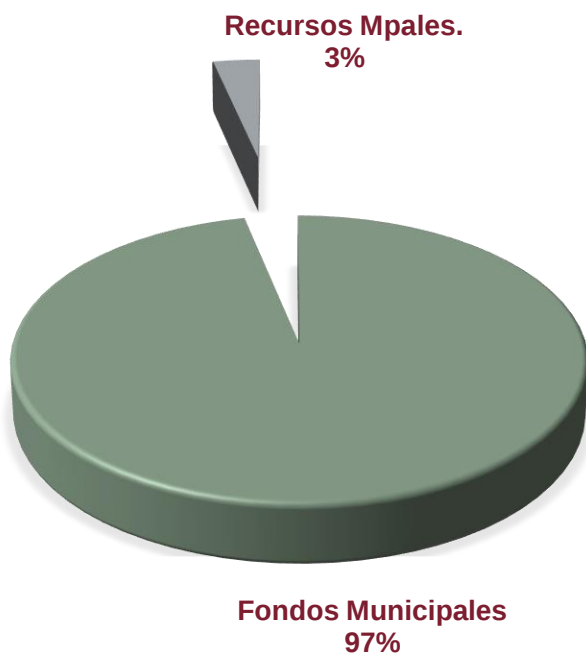

TOTAL DE INVERSIÓN

\$ 148,339,089.53



Pavimentación de calles

M2 CONTRATADOS

Mejoramiento urbano con obras de Pavimentación de calles.

2,034.58 M2



Empedrado Ecologico


14,161.24 M2



Concreto Hidraulico

TOTAL DE M2 DE PAVIMENTO CONTRATADOS

16,195.82 M2

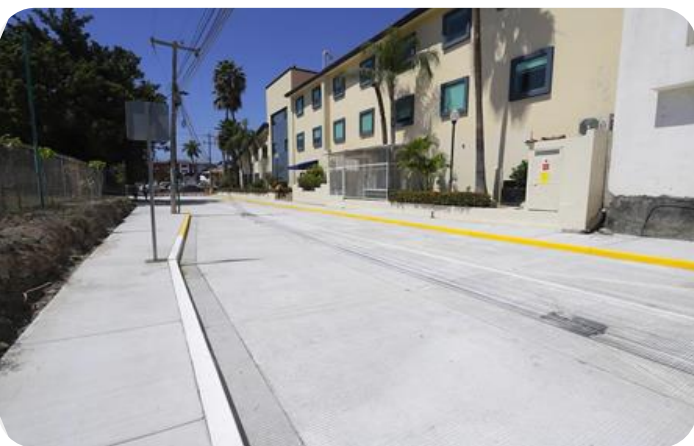

Relación de obra contratada -Pavimentación de calles-

NUM DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA.	M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	M2 DE EMPEDRADO	BENEFICIARIOS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1284.06		56,800
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	2,290.22		56,800
DIOP/CSS/03/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1,348.11		56,800
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	2,031.94		56,800
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	327.33		56,800
DIOP/CSS/11/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE LAS CALLES MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, ARROYO EL CONTENTILLO Y ARROYO PUNTA NEGRA, (DESDE CAUDILLO DEL SUR A ARROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO	241.69	362.51	56,800
DIOP/CSS/12/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	2,468.67		56,800
DIOP/CSS/13/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARÍA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCÉANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	996.59	1,672.07	56,800
DIOP/CSS/14/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	762.83		56,800
DIOP/CSS/15/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	819.23		56,800
DIOP/CSS/16/2025	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1,917.90		56,800
	TOTAL DE M2 DE PAVIMENTO CONTRATADOS ENERO- MARZO	14,161.24 M2	2,034.58 M2	



JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

Bacheo en calles

Programa Permanente de Mantenimiento y rehabilitacion de calles y principales avenidas en mas de 30 colonias atendidas con una o mas acciones.



2,295 M.²



Bacheo en
concreto

430 M.²



Adoquin

250 M.²



Empedrado
ecologico

20 M.²



Asfalto

2,995 M2 DE BACHEO PARA REHABILITACION DE CALLES



JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

En cumplimiento a lo planteado en nuestros compromisos de mejorar la movilidad en el municipio en el trimestre Enero-Marzo del año 2025, se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles a través del despliegue de cuadrillas de bacheo en las siguientes **colonias, calles y avenidas** del municipio:

Colonias atendidas

1. 5 de diciembre	16. Playa de oro
2. Emiliano zapata	17. Gastronómicos
3. el Pitillal	18. Mismaloya
4. Bobadilla	19. Infonavit
5. Canoas	20. Primero de Mayo
6. fovissste 100	21. Las Palmas
7. Ixtapa	22. La Avena
8. Valentín Gómez Farías	23. Agua Azul
9. Guadalupe victoria	24. Santa María
10. las Arboledas	25. Las Gaviotas
11. el Coapinole	
12. Lázaro cárdenas	
13. Versalles	
14. Vallarta 750	
15. Los sauces	

Calles y Avenidas

1. Boulevard Luis Donaldo Colosio
2. Av. Fco. Medina Asencio
3. Exiquio Corona
4. Libertad
5. Av. los tules
6. Libertad
7. Ex Hacienda el Pitillal
8. Av. México
9. Parque Lineal

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CALLES / BACHEO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

Trabajos de mantenimiento	Ene M2	Feb M2	Mar M2	Total M2
Bacheo en empedrado ahogado en concreto (M2)	165	330	1800	2295
Bacheo en empedrado ecologico (M2)	40	60	150	250
Bacheo en asfalto (M2)	0	0	20	20
Formacion de Banquetas, Bancas y Topes (M2)	90	1000	500	1590
Bacheo en adoquin (M2)	190	160	80	430
Reparacion de Rejillas Pluviales (REPARACION)	35	15	8	58
Totales M2 de Bacheo	395	550	2050	2,995
Total de M2 de Banqueta, Bancas y Topes	90	1000	500	1590
Totales Rejillas Pluviales	35	15	8	58

MONTO DE INVERSION: \$ 1,248,297.80



JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

Rehabilitación de bocas de tormenta

Desazolve y reparación de bocas de tormenta en las principales calles y avenidas de la ciudad.

35 PZAS.



Desazolve

15 PZAS



Rehabilitación

1 PZAS.



Nuevas



Rejillas rehabilitadas en los puntos de Quimixto y Compostela, Nicaragua y Av. México, Fco. Medina Ascencio y Pablo Picasso, Manuel Lepe y de las Flores, Carretera a las palmas y Playa Costa Dorada, México y Portal Constitución, Av. México Y los Poetas, Fco Villa y González Gallo, Joaquin Amaro, Luis Donaldo y Colosio y Belice, Fco. Villa y Pavo Real, Av. México y Atemajac, Basilio Badillo e Insurgentes, Par vial, Pulpito, Luis Donaldo Colosio frente a Semefo, Fco, Villa y Agustin Flores, Fco. Villa y Politécnico, Jacarandas y Rodolfo Gómez.



JEFATURA DE MAQUINARIA

Mantenimiento y rehabilitación de calles

Programa permanente de rehabilitación de calles de terracería, rellenos, nivelación. Compactación, cuneteo, retiro de material, con el propósito de mejorar el flujo vial y en general la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

66.15 km.



Nivelación y/o
raspado

131.54 km



Rellenos

8.92 km



Limpieza

Total de kms. rehabilitados en calles con el uso de maquinaria: **206.61 km**

Número de colonias beneficiadas: 70 colonias



JEFATURA DE MAQUINARIA

Desazolve de ríos, arroyos y canales

Se dio inicio al programa preventivo anual de desazolve de ríos, arroyos y canales del Municipio con la finalidad de mitigar los daños que pudieran causar el siguiente temporal de lluvias.

5.4 km



DESAZOLVE

6.25 km



LIMPIEZA

Total de ML intervenidos con el uso de maquinaria: 11.65 km

Número de colonias beneficiadas: 85 colonias



ATENCION A SOLICITUDES CIUDADANAS






Durante el trimestre Enero-marzo de 2025 se recibieron en la oficina de la Dirección de Infraestructura y Obra Publica un total de 350 peticiones ciudadanas destacando dentro de las principales necesidades:

1. Arreglo de calles
2. Limpieza de canales
3. Colocación de topes en calles
4. Limpieza de bocas de tormenta

90% de la solicitudes fueron atendidas



GALERIA FOTOGRAFICA

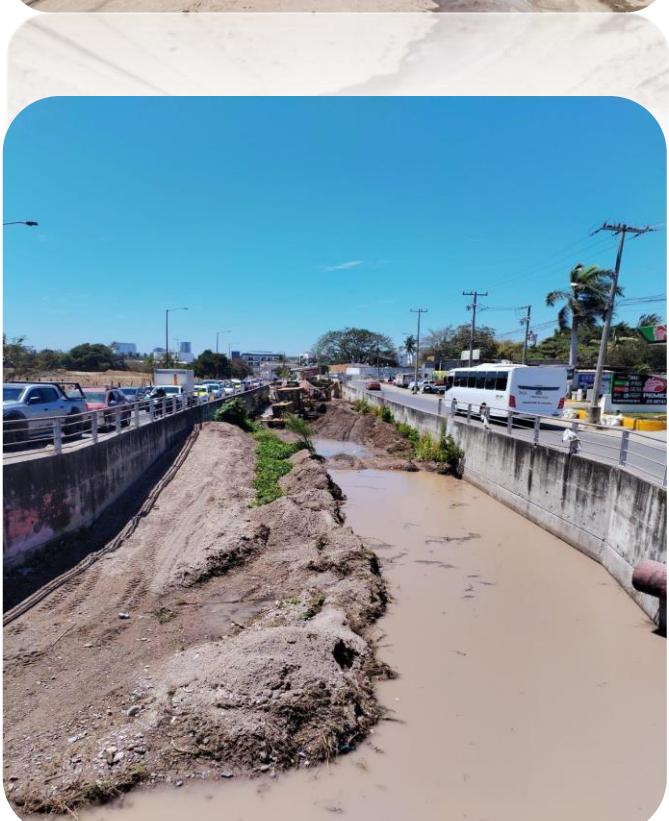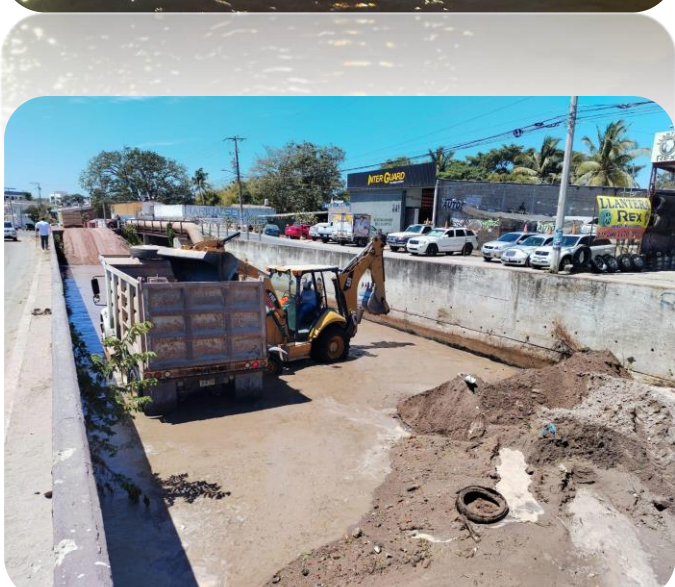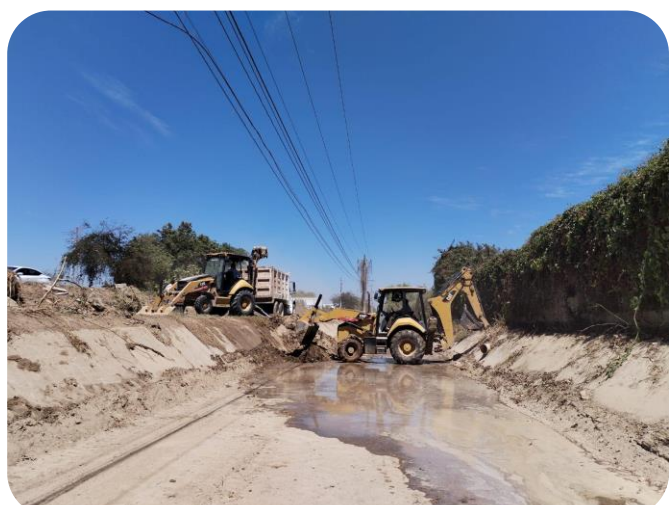

Desazolve de canales





Mantenimiento puentes del rio Cuale



Pavimentación Las Garzas, Boca de Tomatlán



Arranque de obra domo cancha de usos múltiples delegación las palmas



Arranque de obra pavimentación de calle Japón colonia el Mangal.



Arranque de obra domo jardín de niños Juan Escutia del. Ixtapa



Domo en secundaria 84 col. Buenos aires

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



Puerto
Vallarta

NUESTRO PUERTO
RENACE



Limpieza de Calles



Rehabilitación de bocas de tormenta Av. México



Pavimentación calle 20 de nov. col el progreso



Pavimentación calle Juárez, Las Palmas.



pavimentación calle Federación la calma



Prox. Domo Primaria José M. Morelos y Pavón



Pavimentación Av. Federación Col Lomas del coapinoles

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



Puerto
Vallarta

NUESTRO PUERTO
RENACE



Pavimentación calle Federación camino al Jorullo



Construcción de Puente en calle Colon.



Pavimentación calle Japón Col. El Mangal




Pavimentación calle Veracruz Col. Bobadilla



Construcción de domo sec 84 Col. Buenos Aires



Construcción de domo col las Palmas

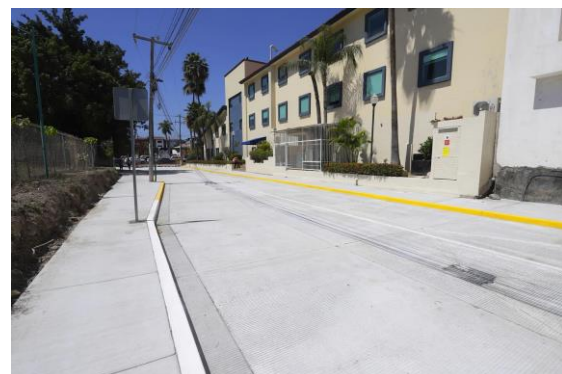

Pavimentación calle María Montessori
