

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
TERRITORIO Y CIUDAD SUSTENTABLE
GOBIERNO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
Octubre-diciembre 2025

Según lo estipulado en el Artículo 245 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, es la dependencia encargada de programar y ejecutar las obras públicas y/o de administrar su adjudicación a contratistas externos, para la ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana, productiva, social, cultural, turística, tecnológica y de seguridad del Municipio.

RESUMEN

Durante el periodo Octubre – Diciembre del 2025, Respecto a la mejora de la infraestructura urbana, derivado de la planeación y ejecución de obra estratégica del municipio, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública con el propósito de cumplir los objetivos propios de la dirección y de esta administración Municipal programo, licito, contrato y ejecuto obra dentro de las que destacan obras para la mejora de vialidades con pavimentación de calles, 4 parques recreativos “Tukilandia”, en infraestructura educativa la construcción de domos, obras con sentido social como las ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado y la continuación de la obra de rehabilitación del malecón de Puerto Vallarta.

Durante este cuarto trimestre de gestión además de que se iniciaron con nuevos proyectos de obra que a continuación se describen, se continuó con el desarrollo de los proyectos, pertenecientes al Programa de Obra del ejercicio 2025.

I. Principales logros o acciones en el trimestre octubre - diciembre.

En este trimestre se llevaron a cabo contrataciones e inicios de obra principalmente en los siguientes rubros:

1. PAVIMENTACIÓN:

“Ampliación de la infraestructura Vial”

Con una Inversión de **\$17,639,950.40** (Diecisiete millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.) para la construcción de 2,111.44 M2 de vialidad en concreto hidráulico principalmente en un proyecto importante como lo es la primera etapa a 4 carriles de la Av. México y en la calle Santa María de la Col. Linda Vista. Con estas obras se contribuye a la mejora de los desplazamientos peatonales y vehiculares, beneficiando a toda la población Vallartense, así como a visitantes nacionales y extranjeros.

2. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Con una inversión de **\$16,162,405.40** se dio inicio a la construcción de ampliaciones de red de agua Potable y red de alcantarillado en las colonias Brisas Ixtapa, Bosques de la primavera y sobre Av. México.

3. PUENTES

Con una inversión de **\$7,059,893.56** se contrató la construcción de 2 puentes en la calle China de la Col. Niños héroes y calle Chachalaca en col. Las Cañadas, respectivamente, contribuyendo a la conectividad de la población de estas dos importantes colonias.

4. DOMOS

“Ampliación de la infraestructura educativa”

Con una inversión de **\$8,467,287.31** se contrató y se dio inicio a la construcción de 1 domo en la escuela secundaria técnica No. 149; 1 domo en la escuela secundaria Gral. No. 119 y 1 Domo en la escuela secundaria técnica No. 81, contribuyendo a la mejora de instalaciones para la impartición de actividad física, así como la realización de eventos especiales en lugares más seguros y protegidos de las inclemencias del tiempo.

5. PARQUES “TUKILANDIA”

“Rehabilitación y construcción de espacios públicos”

Con una inversión de **\$9,230,916.26** se contrató y se dio inicio a la construcción de 4 parque recreativos “Tukilandia” en Frac. Tamarindos, Col Idipe Ixtapa, Col. San Miguel, y Col. La Floresta. Contribuyendo a la mejora de espacios públicos para el esparcimiento de las familias y la interacción social de la población de Puerto Vallarta.

Se describen a continuación a detalle las actividades y resultados de las diferentes oficinas.

Gestoría Integral de Obra Pública

Según lo estipulado en el Artículo 246, del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, para un adecuado despacho de los asuntos de su competencia, adscribe a una Gestoría Integral de la Obra Pública, y cuenta con las Jefaturas Administrativa; de Construcción, Infraestructura y Equipamiento; de Maquinaria; de Mantenimiento y Rehabilitación; y de Costos y Presupuestos.

II. Jefatura de Construcción, Infraestructura y Equipamiento

Según lo estipulado en el Artículo 246 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

En el trimestre Se dio inicio a las siguientes obras:

No.	CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	FONDOS	MONTO	FECHA DE CONTRATO
1	DIOP/AD/43/2025	INSTALACIONES EN AV MÉXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 1,296,684.15	24 DE OCTUBRE



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

2	DIOP/CSS/44/2025	CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO DE FEDERACIÓN AL INGRESO DE PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 12,949,124.50	31 DE OCTUBRE
3	DIOP/CSS/45/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 149, CALLE CEDRO, COLONIA LA PRIMAVERA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 2,902,449.21	31 DE OCTUBRE
4	DIOP/CSS/46/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N. 119 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CALLE PAVO REAL 321, COLONIA LOS TAMARINDOS IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,607,377.59	31 DE OCTUBRE
5	DIOP/AD/47/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 81, CALLE VEINTIUNO DE MARZO, COLONIA LA BOBADILLA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 1,957,460.51	24 DE OCTUBRE
6	DIOP/CSS/48/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHINA, ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE CONGRESO DE LA UNION COLONIA HEROES DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,280,765.20	31 DE OCTUBRE
7	DIOP/CSS/49/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHACHALACA, ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CALLE PAJARO CARPINTERO COLONIA LAS CAÑADAS EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,779,128.36	31 DE OCTUBRE
8	DIOP/AD/50/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 1,084,960.28	24 DE OCTUBRE
9	DIOP/CSS/51/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA IDIPE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 3,034,382.29	31 DE OCTUBRE
10	DIOP/AD/52/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" FRACCIONAMIENTO TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 2,328,715.18	24 DE OCTUBRE
11	DIOP/CSS/53/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 2,782,858.51	31 DE OCTUBRE
12	DIOP/CSS/54/2025	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA, BOSQUES DE LA PRIMAVERA, EN LA DELEGACION DE MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL.	FAISMUN	\$ 11,264,264.20	31 DE OCTUBRE
13	DIOP/CSS/55/2025	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS IXTAPA I Y COL. LAS BRISAS IXTAPA II ETAPA 1, EN LA DELEGACION DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	FAISMUN	\$ 3,601,457.05	31 DE OCTUBRE
14	DIOP/CSS/56/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA MARÍA, ENTRE CALLE MADEIROS Y PRIVADA EN LA COLONIA LINDA VISTA OCEANO, EN PUERTO VALLARTA JALISCO.	MPALES/ICUS	\$4,690,825.90	1 DE DICIEMBRE
15	DIOP/AD/58/2025	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR POR DAÑOS DE HURACAN	ZOFEMAT	\$22,719,166.61	05 DE DIC



PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE


Mezquital #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

RESUMEN DE INVERSIÓN DE LOS PRINCIPALES FONDOS



FONDOS MUNICIPALES.

\$ 4,690,825.90

ZOFEMAT

\$ 22,719,166.61

FAISMUN

\$53,869,627


RECURSOS MUNICIPALES

Para maquinaria y Mantenimiento

\$ 5,637,071.01

TOTAL DE INVERSIÓN

\$ 86,916,690.52

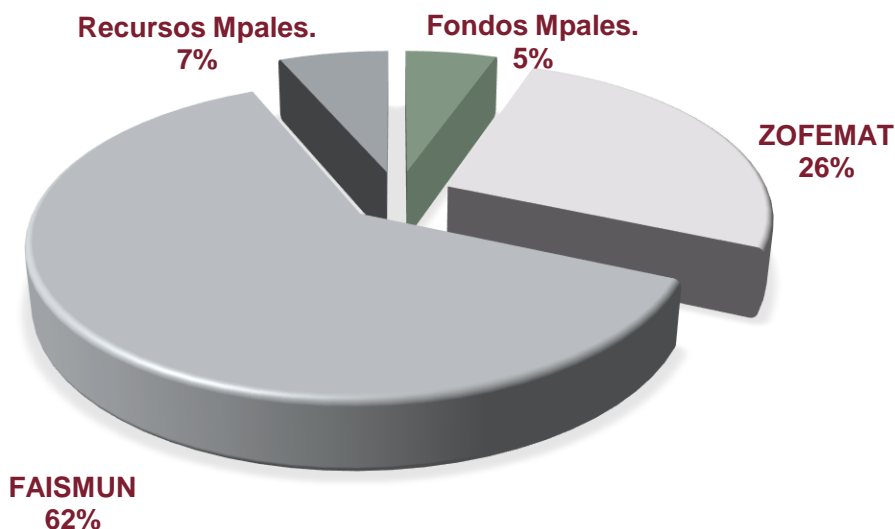

PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE

Mezquital #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx

Relación y estatus de obras en proceso al 19 de diciembre de 2025

Supervisión, elaboración de estimaciones y control de avance de las obras en proceso.

No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
DIOP/CSS/01/2025	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCION COL. BOVADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,913,479.74	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	10 DE MAYO 2025	50%	47%	PROCESO
DIOP/CSS/02/2025	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE LA CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,613,690.43	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	30 DE MAYO 2025	100%	95%	TERMINADA
DIOP/CSS/03/2025	PVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITALIA DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,436,442.27	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	30 DE ABRIL 2025	100%	97%	TERMINADA
DIOP/CSS/04/2025	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,133,606.98	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	30 DE MAYO 2025	98%	93%	PROCESO
DIOP/CSS/05/2025	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,757,022.37	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	29 DE JUNIO 2025	100%	96%	TERMINADA
DIOP/CSS/06/2025	REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$6,720,617.34	21 DE ENERO 2025	30 DE ENERO 2025	30 DE MAYO 2025	60%	42%	PROCESO
DIOP/AD/08/2025	MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PRISCILIANO SANCHEZ EN LA COLONIA DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,409,759.83	17 DE ENERO 2025	21 DE ENERO 2025	20 DE ABRIL 2025	100%	96%	TERMINADA
DIOP/AD/07/2025	REHABILITACIÓN ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO	\$12,981,465.04	11 DE FEBRERO 2025	17 DE FEBRERO	17 DE JUNIO	100%	100%	TERMINADA
DIOP/AD/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,795,353.53	06 DE FEBRERO 2025	11 DE FEBRERO	11 DE MAYO	100%	0%	TERMINADA
DIOP/AD/10/2025	COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$1,621,194.95	06 DE FEBRERO DE 2025	11 DE FEBRERO	11 DE ABRIL	100%	100%	TERMINADA



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

DIOP/CSS/11/2025	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDEN LAS CALLE MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, AROYO EL CONTENTILLO Y AROYO PUNTA NEGRA (DESDE CAUDILLO DEL SUR A AROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,158,729.94	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	3 DE JULIO	70%	55%	PROCESO
DIOP/CSS/12/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA LAS PALMAS, COL. LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO.	\$9,359,159.61	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	3 DE JULIO	100%	90%	TERMINADA
DIOP/CSS/13/2025	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARIA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA COLONIA LINDA VISTA OCEANO EN PUERTO VALLARTA JALISCO	\$9,596,291.08	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	13 DE JUNIO	98%	45%	PROCESO
DIOP/CSS/14/2025	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I MADERO, DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COL. CENTRO IXTAPA, PUERTO VALARTA, JALISCO.	\$7,012,650.44	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	13 DE JUNIO	95%	69%	PROCESO
DIOP/CSS/15/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,627,244.42	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	3 DE JUNIO	70%	48%	PROCESO
DIOP/CSS/16/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA JALISCO	\$7,892,892.47	25 DE FEBRERO 2025	5 DE MARZO	3 DE JULIO	100%	100%	TERMINADA
DIOP/AD/17/2025	REHABILITACION DE CENEFAS, SELLO LAVADO E INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS DE GRAPA EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA JALISCO	\$2,125,978.48	21 DE FEBRERO	06 DE MARZO	14 DE ABRIL	100%	99%	TERMINADA
DIOP/AD/18/2025	PAVIMENTO A BASA DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRES SOLER ENTRE CALLE MARIO MORENO Y CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LA MODERNA EN PUERTO VALNART, JALISCO.	\$2,516,764.41	21 DE FEBRERO	06 DE MARZO	03 DE JUNIO	100%	76%	TERMINADA
DIOP/CSS/19/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACION Y OBRAS DE PROTECCION EN CAUCE DEL RIO PITILLAL DEL CADENAMIENTO 0+000 (PUENTE BLVD. FCO MEDINA ASCENCIO) A CAD 3+966.94 (PUENTE AV. FEDERACION) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$12,389,526.57	10 DE MARZO	19 DE MARZO	17 DE JUNIO	100%	100%	TERMINADA
DIOP/CSS/20/2025	DESAZOLVE, LIMPIEZA DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$9,526,353.49	10 DE MARZO	19 DE MARZO	27 DE JUNIO	100%	60%	TERMINADA



PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE

Mezquital #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

DIOP/CSS/21/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN EL CAUSE DEL RIO PITILLAL TRAMO 1 (4+680 A 5+080), TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+440) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,013,393.15	10 DE MARZO	19 DE MARZO	17 DE JUNIO	95%	92%	TERMINADA
DIOP/CSS/22/2025	REHABILITACION Y REMODELACION DE COMISARIA DE POLICIA EN ANTIGUO CAMINO AL CANTON, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$3,089,635.06	3 DE ABRIL DE 2025	14 DE ABRIL	11 DE AGOSTO	95%	75%	PROCESO
DIOP/CSS/23/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRULLA ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACRO PLAZA COL. LOS SAUCES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,579,662.68	3 DE ABRIL DE 2025	14 DE ABRIL	22 DE JULIO	100%	76%	TERMINADA
DIOP/CSS/24/2025	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLAMINGO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACROPLAZA COL. LOS SAUCES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,764,463.45	3 DE ABRIL DE 2025	14 DE ABRIL	22 DE JULIO	100%	67%	TERMINADA
DIOP/CSS/25/2025	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE RIO DANUBIO ENTRE CALLE RIO LERMA Y RIO SUCHIATE COL LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$3,308,007.09	3 DE ABRIL DE 2025	14 DE ABRIL	12 DE JULIO	98%	69%	PROCESO
DIOP/CSS/26/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA-	\$7,466,374.25	3 DE ABRIL DE 2025	14 DE ABRIL	12 DE JULIO	100%	69%	TERMINADA
DIOP/AD/27/2025	REHABILITACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA, COL LAS JUNTAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO.	\$2,091,416.18	31 DE MARZO 2025	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	99%	99%	PROCESO
DIOP/AD/28/2025	REHABILITACION CDC IXTAPA CALLE MANCO COLONIA 24 DE FEBRERO EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,524,828.82	31 DE MARZO 2025	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	100%	100%	TERMINADA
DIOP/AD/29/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y BANQUETA EN RIBERA DEL RIO CUALE (DE CALLE MANANTIAL A PUENTE PEATONAL) EN COL. BUENOS AIRES, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,206,227.99	31 DE MARZO	10 DE ABRIL	8 DE JULIO	100%	98%	TERMINADA
DIOP/LP/32/2025	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	\$18,561,145.40	03 DE JUNIO	11 DE JUNIO	20 DE DICIEMBRE	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/30/2025	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KRYSTAL VALLARTA DE CALLE VIDAFEL A GARZA BLANCA (AV. FEDERACION) EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$5,042,357.60	11 DE JULIO	18 DE JULIO	25 DE OCTUBRE	43%	0%	PROCESO
DIOP/AD/31/2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MUELLE DE BOCA DE TOMATLAN, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,886,793.33	01 DE JULIO	18 DE JULIO	15 DE OCTUBRE	70%	0%	PROCESO



PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE

Mezquital #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

DIOP/CSS/33/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 56 CALLE ALDAMA N 260 COLONIA IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,379,942.14	11 DE JULIO	18 DE JULIO	15 DE OCTUBRE	100%	41%	TERMINADA
DIOP/CSS/34/2025	MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL CERRO PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,131,442.40	11 DE JULIO	18 DE JULIO	25 DE OCTUBRE	70%	21%	PROCESO
DIOP/AD/35/2025	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COLONIA DEL TORO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,404,445.84	01 DE JULIO 2025	18 DE JULIO	15 DE OCTUBRE	50%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/38/2025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SOBRE CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$10,031,738.50	15 DE AGOSTO	22 DE AGOSTO	07-ENE-26	90%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/39/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$8,500,784.86	15 DE AGOSTO	8 DE SEPT	25 DE ENERO 2026	80%	0%	PROCESO
DIOP/AD/40/2025	OBRA EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$5,994,315.47	19 DE AGOSTO	28 DE AGOSTO	25 DE NOVIEMBRE	40%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/41/2025	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$4,476,018.19	03 DE SEPTIEMBRE	15 DE SEPTIEMBRE	13 DE DICIEMBRE	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/42/2025	ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA Y DE COMPORTAMIENTO HIDRODINAMICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LAS PEÑAS EN EL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$2,830,400.00	03 DE SEPTIEMBRE	15 DE SEPTIEMBRE	11 DE FEBRERO 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/AD/43/2025	INSTALACIONES EN AV MÉXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACÍFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,296,684.15	24 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	20%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/44/2025	CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MEXICO DE FEDERACIÓN AL INGRESO DE PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$12,949,124.50	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/45/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 149, CALLE CEDRO, COLONIA LA PRIMAVERA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,902,449.21	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	20%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/46/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N. 119 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CALLE PAVO REAL 321, COLONIA LOS TAMARINDOS IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$3,607,377.59	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	20%	0%	PROCESO



PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE

Mezquitla #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx



Puerto
Vallarta

Dirección de
Infraestructura y
Obra Pública

DIOP/AD/47/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 81, CALLE VEINTIUNO DE MARZO, COLONIA LA BOBADILLA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$1,957,460.51	24 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	15%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/48/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHINA, ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE CONGRESO DE LA UNION COLONIA HEROES DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$3,280,765.20	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	10%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/49/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHACHALACA, ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CALLE PAJARO CARPINTERO COLONIA LAS CAÑADAS EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$3,779,128.36	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/AD/50/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	\$1,084,960.28	24 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	8%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/51/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA IDIPE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	\$3,034,382.29	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	10%	0%	PROCESO
DIOP/AD/52/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" FRACCIONAMIENTO TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	\$2,328,715.18	24 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/53/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	\$2,782,858.51	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/54/2025	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA, BOSQUES DE LA PRIMAVERA, EN LA DELEGACION DE MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$11,264,264.20	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	10%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/55/2025	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS IXTAPA I Y COL. LAS BRISAS IXTAPA II ETAPA 1, EN LA DELEGACION DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$3,601,457.05	31 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE	03 DE FEB 2026	5%	0%	PROCESO
DIOP/CSS/56/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA MARÍA, ENTRE CALLE MADEIROS Y PRIVADA EN LA COLONIA LINDA VISTA OCEANO, EN PUERTO VALLARTA JALISCO.	\$4,690,825.90	1 DE DICIEMBRE	09 DE DIC	08 DE MARZO 2026	0	0	EN PROCESO DE ANTICIPO
DIOP/AD/58/2025	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR POR DAÑOS DE HURACAN..	\$22,719,166.61	28 DE NOV	05 DE DIC	31 DE ENE 2026	30%	30%	PROCESO



PUERTO
VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

NUESTRO PUERTO
RENACE

Mezquitla #613, Col. Los Portales, Puerto Vallarta, Jalisco
01 (322) 178 80 00 | Ext. 1239 | www.puertovallarta.gob.mx

III. Jefatura de Maquinaria

Según lo estipulado en el Artículo 246 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Mantenimiento y rehabilitación de calles

Programa permanente de rehabilitación de calles de terracería y caminos saca cosechas, a través de rellenos, nivelación, compactación, cuneteo, retiro de material, con el propósito de mejorar el flujo vial y en general la calidad de vida de los habitantes del Municipio



Nivelación y/o raspado 48,230 ML



Rellenos 87,500 ML



Limpieza 30,000 ML

Total de kms. rehabilitados con el uso de maquinaria: **165,730 ML**


Numero de colonias beneficiadas: 70 colonias



2. Desazolve de ríos, arroyos y canales

Se continua con el programa preventivo anual de desazolve de ríos, arroyos y canales del Municipio con la finalidad de mitigar los daños que pudieran causar el presente temporal de lluvias.

CAUCE											12 de OCT al 20 de NOV	Total ML
LA VIRGEN												900
CANAL MOJONERAS												350
CANAL AV. LAS PALMAS												1250
TOTAL ML DESAZOLVADO												2,500 ML

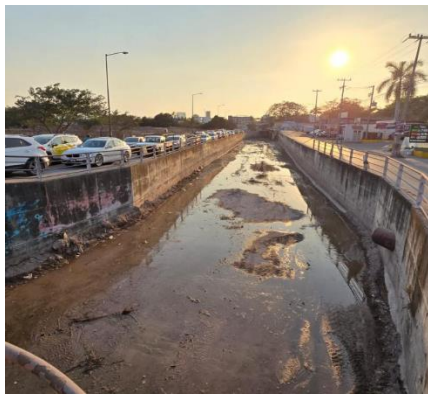


IV. Jefatura de Mantenimiento y Rehabilitación

Según lo estipulado en el Artículo 246 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

En cumplimiento a lo planteado en nuestros compromisos de mejorar la movilidad en el municipio, se destinaron recursos económicos superiores a los **\$3,553,285.60.** con los que se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles a través del despliegue de cuadrillas de bacheo a más de **80 colonias** del municipio entre ellas: Emiliano Zapata, Centro, El Caloso, Las Peñas, Las Canoas, El Remanse, 12 de octubre, las gaviotas, las Aralias, 5 de diciembre, villas del puerto, Jardines del Puerto, frac. Vallarta 500, Vallarta 750, Aramara, Valentín Gómez Farías, Barrio Santa María, ex haciendas el Pitillal, zona hotelera norte, frac. Villa Sol, El Pitillal, Las Juntas, Ixtapa, Deleg. las Palmas, Zona romántica, Paso ancho, Versalles, Parque las palma, lomas del Coapinole, agua azul, Portales entre otras; en suma, más de **7900 m2** de bacheo.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CALLES / BACHEO EN EL TRIMESTRE OCT-DIC 2025


Trabajos de mantenimiento	Oct	Nov	Dic	Total
	M2	M2	M2	M2
Bacheo en empedrado ahogado en concreto (M2)	915	1135	714	2764
Bacheo en empedrado ecológico (M2)	639	980	920	2539
Bacheo en asfalto (M2)	500	700	200	1400
Formación de Banquetas, Bancas y Topes (M2)	250	180	50	480
Bacheo en adoquín (M2)	400	600	200	1200
Reparación de Rejillas Pluviales	20	15	17	52
Totales M2 de Bacheo	2454	3415	2034	7903
Total de M2 de Banqueta, Bancas y Topes	250	180	50	480
Totales Rejillas Pluviales	20	15	17	52

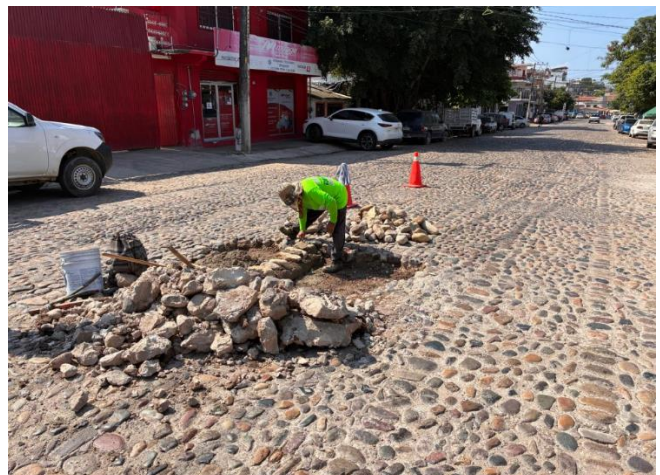

REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA

Con la presencia del presente temporal de lluvias se llevó a cabo un intenso programa de rehabilitación y limpieza de bocas de tormenta y rejillas en diferentes partes de la ciudad. Después de las fuertes lluvias se hizo el retiro de basura y restos de poda con la finalidad de mitigar y controlar los riesgos de futuras inundaciones.

Rejillas rehabilitadas en los puntos de Quimixto y Compostela, Nicaragua y Av. México, Fco. Medina Ascencio y Pablo Picasso, Manuel Lepe y de las Flores, Carretera a las palmas y Playa Costa Dorada, México y Portal Constitución, Av. México Y los Poetas, Fco Villa y González Gallo, Joaquín Amaro, Luis Donaldo y Colosio y Belice, Fco. Villa y Pavo Real, Av. México y Atemajac, Basilio Badillo e Insurgentes, Par vial, Pulpito, Luis Donaldo Colosio frente a Semefo, Fco, Villa y Agustín Flores, Fco. Villa y Politécnico, Jacarandas y Rodolfo Gómez.

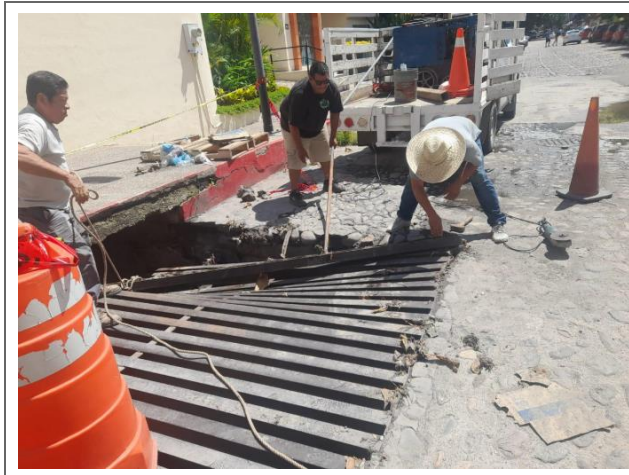

V. Jefatura de Costos y Presupuestos

Según lo estipulado en el Artículo 246 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Análisis de costos: se evaluó la viabilidad financiera de los proyectos de las obras que se dieron inicio y que están en proceso mencionadas en el apartado III de jefatura de construcción.
 2. Se llevaron a cabo los estudios de mercado y cotizaciones para la elaboración de la propuesta económica base de los proyectos y obras que dieron inicio en el trimestre en mención:
- **Presupuesto base**
 - **Programa de obra**
 - **Precios unitarios del presupuesto base**
 - **Explosión de insumos del presupuesto base**

No.	CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	FONDOS	MONTO	FECHA DE CONTRATO
1	DIOP/AD/43/2025	INSTALACIONES EN AV MÉXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACÍFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 1,296,684.15	24 DE OCTUBRE
2	DIOP/CSS/44/2025	CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MEXICO DE FEDERACIÓN AL INGRESO DE PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 12,949,124.50	31 DE OCTUBRE
3	DIOP/CSS/45/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 149, CALLE CEDRO, COLONIA LA PRIMAVERA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 2,902,449.21	31 DE OCTUBRE
4	DIOP/CSS/46/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N. 119 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CALLE PAVO REAL 321, COLONIA LOS TAMARINDOS IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,607,377.59	31 DE OCTUBRE
5	DIOP/AD/47/2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 81, CALLE VEINTIUNO DE MARZO, COLONIA LA BOBADILLA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 1,957,460.51	24 DE OCTUBRE
6	DIOP/CSS/48/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHINA, ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE CONGRESO DE LA UNION COLONIA HEROES DE LA PATRIA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,280,765.20	31 DE OCTUBRE
7	DIOP/CSS/49/2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PREFABRICADO EN LA CALLE CHACHALACA, ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CALLE PAJARO CARPINTERO COLONIA LAS CAÑADAS EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	FAISMUN	\$ 3,779,128.36	31 DE OCTUBRE
8	DIOP/AD/50/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 1,084,960.28	24 DE OCTUBRE
9	DIOP/CSS/51/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA IDIPE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 3,034,382.29	31 DE OCTUBRE
10	DIOP/AD/52/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" FRACCIONAMIENTO TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 2,328,715.18	24 DE OCTUBRE

11	DIOP/CSS/53/2025	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	FAISMUN	\$ 2,782,858.51	31 DE OCTUBRE
12	DIOP/CSS/54/2025	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA, BOSQUES DE LA PRIMAVERA, EN LA DELEGACION DE MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL	FAISMUN	\$ 11,264,264.20	31 DE OCTUBRE
13	DIOP/CSS/55/2025	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS IXTAPA I Y COL. LAS BRISAS IXTAPA II ETAPA 1, EN LA DELEGACION DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	FAISMUN	\$ 3,601,457.05	31 DE OCTUBRE
14	DIOP/CSS/56/2025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA MARÍA, ENTRE CALLE MADEIROS Y PRIVADA EN LA COLONIA LINDA VISTA OCEANO, EN PUERTO VALLARTA JALISCO.	FONDOS MPALES/ICUS	\$4,690,825.90	1 DE DICIEMBRE
15	DIOP/AD/58/2025	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR POR DAÑOS DE HURACAN	ZOFEMAT	\$22,719,166.61	05 DE DIC

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco 19 de diciembre de 2025

ING. EDEN ARTURO CASTILLON VILLASEÑOR

Director de Infraestructura y Obra Pública
